



Aan Bestuurlijk Overleg

Nationaal Coördinator  
Groningen

Behandeld door

Datum  
4 maart 2019Kenmerk  
NCG / 19061830

Kopie aan

Bijlage(n)  
1

# memo

## Plan van aanpak versnellen

Bij alle betrokken partijen is behoefte aan het versnellen van de versterkingsoperatie. De versnellingsmogelijkheden zijn met name gelegen in: ontwikkeling van expertsystemen voor de beoordeling van gebouwen, standaardisatie door typologiebenadering van gebouwen, doorontwikkeling van de NPR en procesversnellingen.

### Versnelling

- Rekenmethodiek voor het beoordelen van gebouwen wordt sneller, een halvering ten opzichte van 2016.
- De leercurve van ingenieursbureaus en automatisering van het totale proces (van data tot oplevering VA).
- Ontwikkelen typologie aanpak. De eerste 3 typologieën/clusters zijn in ontwikkeling. Aan het einde van Q2 zullen 3 typologieën en clusters inclusief standaard maatregelenpakketten gereed zijn.

Rekenmethodieken [inzet per scope/jaar]			
2016	NLTH (35%)	MRS	NLPO (60%)
2019	NLTH (15%)	MRS	NLPO (65%) GSAT (15%)
2020	NLTH (10%)	MRS	NLPO (45%) GSAT (40%)


Oplevering van Versterkingsadviezen [wk/analyse]			
2016	NLTH (16 wk)	MRS (10 wk)	NLPO (8 wk)
2019	NLTH (10 wk)	MRS (8 wk)	NLPO (6 wk) GSAT (2 wk)
2020	NLTH (8 wk)	MRS (6 wk)	NLPO (4) G {GSAT (1 wk)}

### Randvoorwaarden

- EZK geeft samen met regio opdracht aan TNO voor validatie van criteria voor samenstelling typologieën/clusters en voor validatie van criteria van maatregelenpakketten. NCG is aanspreekpunt.
- Technische Commissie adviseert NCG.
- NCG ontwikkelt voor de typologie aanpak in samenwerking met CVW opdrachtbeschrijving met eenduidige definities en uitvragen, gedetailleerde planning (met deelproducten), onderbouwde financieringsvraag en inzicht in welke partij wat doet.
- Pilot uitvoering gestandaardiseerde maatregelen (VIIA) in uitvoering tbv typologie-aanpak. Na de zomer in uitvoering.

Planning

Nationaal Coördinator  
Groningen

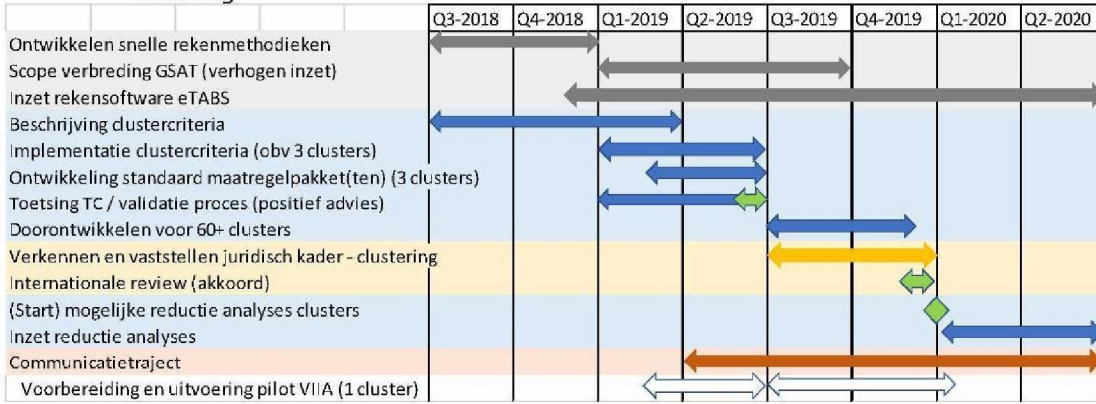

**Kenmerk**  
NCG / 19061830
