

Mijlpalen en dashboard

maart 2020, (10)(2e) en (10)(2e)

- Doel: eenduidige rapportage, die voorziet in de behoefte van gemeenten
- Tijdpad:
 - Besluitvorming in gemeenten
 - Bouwen systeem bij NCG

NU: houtje touwtje, vanaf najaar rapportage obv BKG (Bouwen, kansrijk Groningen = registratiesysteem van de NCG)

Mijlpalen NCG op strategisch, tactisch en operationeel niveau

Indicatoren en dashboards

Primair proces	Strategische mijlpalen obv wet	Tactische voortgangscijfers	Tedding	Governance (IBOV)	Inkoop en betaling	Strategische planning mijlpalen	Meerjarbegroting	Mantreksbewoer en eigenaar	Huidig extern dashboard
Ontwikkeling	1	In werkvoorraad opgenomen	Het adres is opgenomen in de goedgekeurde lijst obv HRA, verkrijging of opname op eigen verzoek.	Toevoeging werkvoorraad of afgesproken processen		Eigen veronderstelling over in proces komen van werkvoorraad	Eigen veronderstelling over gemiddelde kosten totale proces	pm	Totaal
	2	In lokaal plan opgenomen	Het adres is in zoppe van de door de gemeente goedgekeurd lokaal plan.	Eventueel bezwaar tegen lokaal plan door NCG		Eerste plating obv kerntalen doorlooptijd	Kosten totale proces aanpassen obv adressen in lokaal plan	pm	
	3	In clusterin en planning opgenomen	Het adres is opgenomen in een goedgekeurde clusterin (adresenlijst in aanbestedbare pakketten).	Planning conform gemeentelijke afspraken en IBOV	Budget vrijgemaakt voor beoerdeling	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
Opname & Normering	4	Opdracht opname en/of beoerdeling gegund	Het contract met het ingenieur bureau is getekend, dan wel de inkooporder is verstuurd naar het ingenieur bureau.	Opdrachtverlening conform inkoopbeleid en geldende normen	Budget gealloceerd naar opdrachtnemer	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
	5	Opnamebezoek afgetekend	De akkoordverklaring is getekend dat de opname heeft plaatsgevonden en evt. herstell werkzaamheden zijn voltooid.		Betaling obv voortgangindicator	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	Opname
	6	Beoerdeling ontvangen	De beoerdeling is voor de eerste keer ontvangen van het ingenieur bureau.			Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
	7	Beoerdeling geaccepteerd	De beoerdeling is geaccepteerd door NCG.	Beoerdeling voldoet aan elsen IBOV	Decharge opdrachtnemer	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	Beoordeling (NB: afgeand of definitie CWV)
	8	Normbesluit treedt in werking	Normbesluit is opgesteld, inclusief aanmerkingen, is verzonden naar eigenaar en gemeente en de ontvangstbevestiging is ontvangen.	Normbesluit conform geldende normen en wet- en regelgeving		Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
9	Normbesluit onherroepelijk	6 weken na publicatie voorgenomen Normbesluit, of langer indien de eigenaar (of eventuele derde belanghebbenden) bezwaar/beroep is gestart.			Aanpassen obv realisatie en inhoud Normbesluit	Kosten BKV obv Normbesluit + oplag bijkomende kosten	pm		
Ontwerp	10	Ontwerpsvoorstel goedgekeurd	Scope, budget, planning, organisatie, aanpak zijn goedgekeurd en projectleider is aangesteld.	Ontwerpsvoorstel of Normbesluit, kosten BKV of IBOV	Budget vrijgemaakt voor ontwerp en realisatie	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	Project vastgesteld (NB: uitvalleind projectdefinitie)
	11	1e opdracht definitief ontwerp gegund	Contract is getekend met de (eerste) ontwerpende aannemer/architect, dan wel de inkooporder is verstuurd naar de ontwerpende aannemer/architect.	Opdrachtverlening conform inkoopbeleid en geldende normen	Budget ontwerp gealloceerd naar opdrachtnemer	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
	12	Laatste definitief ontwerp goedgekeurd	Het laatste definitieve ontwerp is ontvangen van de ontwerpende aannemer/architect en goedgekeurd.		Decharge opdrachtnemer voor ontwerp	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
	13	Concept versterkingsbesluit gereed	Projectplan realisatie goedgekeurd, inclusief Vaststellingsoverenkomst met bewoner, vergunningen, voorgenomen opdracht aannemer	Conform Normbesluit, kosten BKV of IBOV		Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
	14	Versterkingsbesluit treedt in werking	Versterkingsbesluit is verzonden aan eigenaar (nog in discussie)			Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
	15	Versterkingsbesluit onherroepelijk	6 weken na publicatie voorgenomen Versterkingsbesluit, of langer indien de eigenaar of derde belanghebbenden bezwaar/beroep is gestart.			Aanpassen obv realisatie en planning in Aanvraag	Kosten BKV obv Definitief ontwerp + oplag bijkomende kosten	pm	
Realisatie	16	1e opdracht bouwkundige versterking onherroepelijk	Alle opschortende voorwaarden voor start uitvoering zijn vervuld, start voorbereiding	Opdrachtverlening conform inkoopbeleid en geldende normen	Budget realisatie gealloceerd naar opdrachtnemer	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
	17	Bouwkundige versterking is gestart	De aannemer is gestart met bouwkundige werkzaamheden.		Betaling obv voortgangindicator	Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	
	18	Bouwkundige versterking gereed	Het proces verbaal van oplevering is getekend.			Aanpassen obv realisatie en/of gewijzigde projectplanning		pm	Uitvoering voltooid
	19	Op norm verklaard	Het adres is op norm verklaard en dit is verwerkt in het openbaar register (Kadaster).	Op normverklaring of afgesproken processen en geldende normen		Realisatie	Realisatie	pm	
	20	Decharge ontwerp en uitvoering verleend	Het project heeft een geaccordeerde decharge gekregen.	Evaluatie	Decharge opdrachtnemer voor realisatie			pm	

Mijlpalen strategisch/ tactisch, oud/ nieuw

1/2

Indicatoren en dashboards



Primair proces	Strategische mijlpalen obv wet		Tactische voortgangsindicatoren	Huidig extern dashboard	Voorstel nieuw dashboard
Ontwikkeling	1	In werkvoorraad opgenomen		Totaal	In werkvoorraad
	2	In Lokaal plan opgenomen			In Lokaal plan
	3		In clustering en planning opgenomen		
Opname & Normering	4		Opdracht opname en/of beoordeling gegund		
	5		Opnamebezoek afgetekend	Opname	Opname
	6		Beoordeling ontvangen		
	7		Beoordeling geaccepteerd	Beoordeling (NB: afgerond cf definitie CVW)	Beoordeling (indien geen Normbesluit)
	8	Normbesluit treedt in werking			Normbesluit (inwerkingtreding of onherroepelijk)
	9	Normbesluit onherroepelijk			

Mijlpalen strategisch/ tactisch, oud/nieuw

2/2

Primair proces	Strategische mijlpalen obv wet	Tactische voortgangsimplicatoren	Huidig extern dashboard	Voorstel nieuw dashboard	
Ontwerp	10	Ontwerpvoorstel goedgekeurd	Project vastgesteld (NB: uitsluitend projectdefinitie)	Ontwerpvoorstel gereed	
	11	1e opdracht definitief ontwerp gegund			
	12	Laatste definitief ontwerp goedgekeurd			
	13	Concept versterkingsbesluit gereed			
	14	Versterkingsbesluit treedt in werking			Versterkingbesluit (inwerkingtreding of onherroepelijk)
	15	Versterkingsbesluit onherroepelijk			
	16			1e opdracht bouwkundige versterking onherroepelijk	
Realisatie	17	Bouwkundige versterking is gestart		Versterking gestart	
	18		Bouwkundige versterking gereed	Uitvoering voltooid	
	19	Op norm verklaard		Op norm	
	20		Decharge ontwerp en uitvoering verleend		
Nog te bepalen	21	Uit proces zonder bouwkundige versterking		Uit proces	

Gemeentelijke terminologie

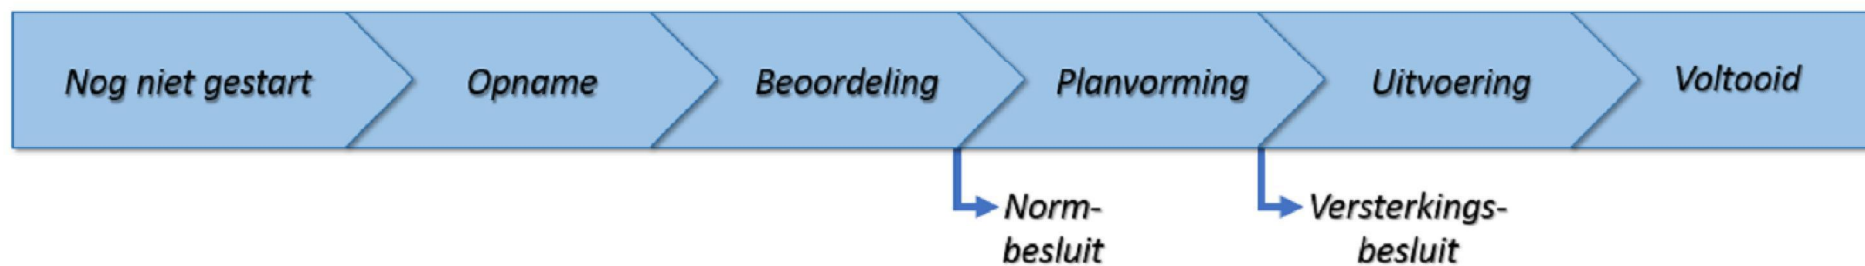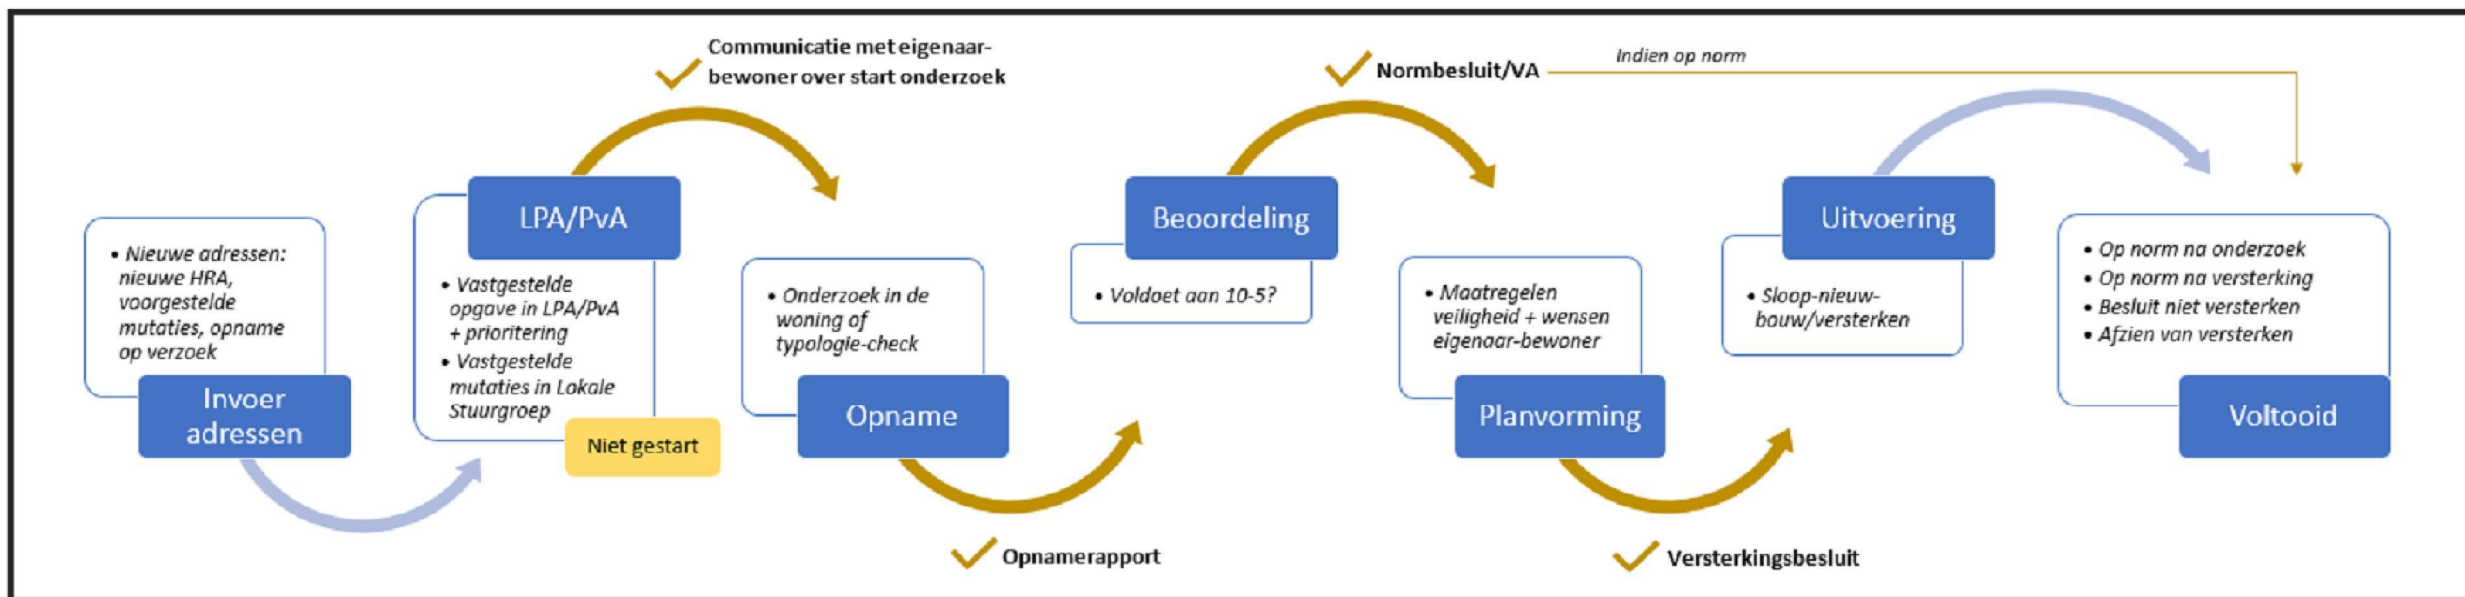

Vergelijking NCG terminologie en gemeentelijke terminologie 1/2


Indicatoren en dashboards

Primair proces	Strategische mijlpalen obv wet		Tactische voortgangsindicatoren	Huidig extern dashboard	Voorstel nieuw dashboard	
Ontwikkeling	1	In werkvoorraad opgenomen		Totaal	In werkvoorraad	} (Invoer adressen)
	2	In Lokaal plan opgenomen			In Lokaal plan	
Opname & Normering	3		In clustering en planning opgenomen			} Nog niet gestart
	4		Opdracht opname en/of beoordeling gegund			
	5		Opnamebezoek afgetekend	Opname	Opname	} Opname
	6		Beoordeling ontvangen			
	7		Beoordeling geaccepteerd	Beoordeling (NB: afgerond cf definitie CVW)	Beoordeling (indien geen Normbesluit)	
		8	Normbesluit treedt in werking			} Beoordeling
		9	Normbesluit onherroepelijk		Normbesluit (inwerkingtreding of onherroepelijk)	

Vergelijking NCG terminologie en gemeentelijke terminologie 2/2

Primair proces	Strategische mijlpalen obv wet	Tactische voortgangscijfers	Huidig extern dashboard	Voorstel nieuw dashboard	
Ontwerp	10	Ontwerpvoorstel goedgekeurd	Project vastgesteld (NB: uitsluitend projectdefinitie)	Ontwerpvoorstel gereed	} <i>Planvorming</i>
	11	1e opdracht definitief ontwerp gegund			
	12	Laatste definitief ontwerp goedgekeurd			
	13	Concept versterkingsbesluit gereed			
	14	Versterkingsbesluit treedt in werking			
	15	Versterkingsbesluit onherroepelijk			
Realisatie	16	1e opdracht bouwkundige versterking onherroepelijk		Opdracht aan aannemers verleend	} <i>Uitvoering</i>
	17	Bouwkundige versterking is gestart		Versterking gestart	
	18	Bouwkundige versterking gereed	Uitvoering voltooid		
	19	Op norm verklaard		Op norm	
	20	Decharge ontwerp en uitvoering verleend			} <i>Voltooid</i>
Nog te bepalen	21	Uit proces zonder bouwkundige versterking		Uit proces	


Invulling dashboard



Q4 2019 31-12-2019	2.820	613	701	402	61	324 + 22	4.943
Q1 2020 31-3-2020	-	-	-	-	-	-	
Q2 2020 30-6-2020	-	-	-	-	-	-	
Q3 2020 30-9-2019	-	-	-	-	-	-	
Q4 2020 31-12-2020	-	-	-	-	-	-	

Invulling dashboard

■ Nog niet gestart ■ Opname ■ Beoordeling ■ Planvorming ■ Uitvoering ■ Voltooid

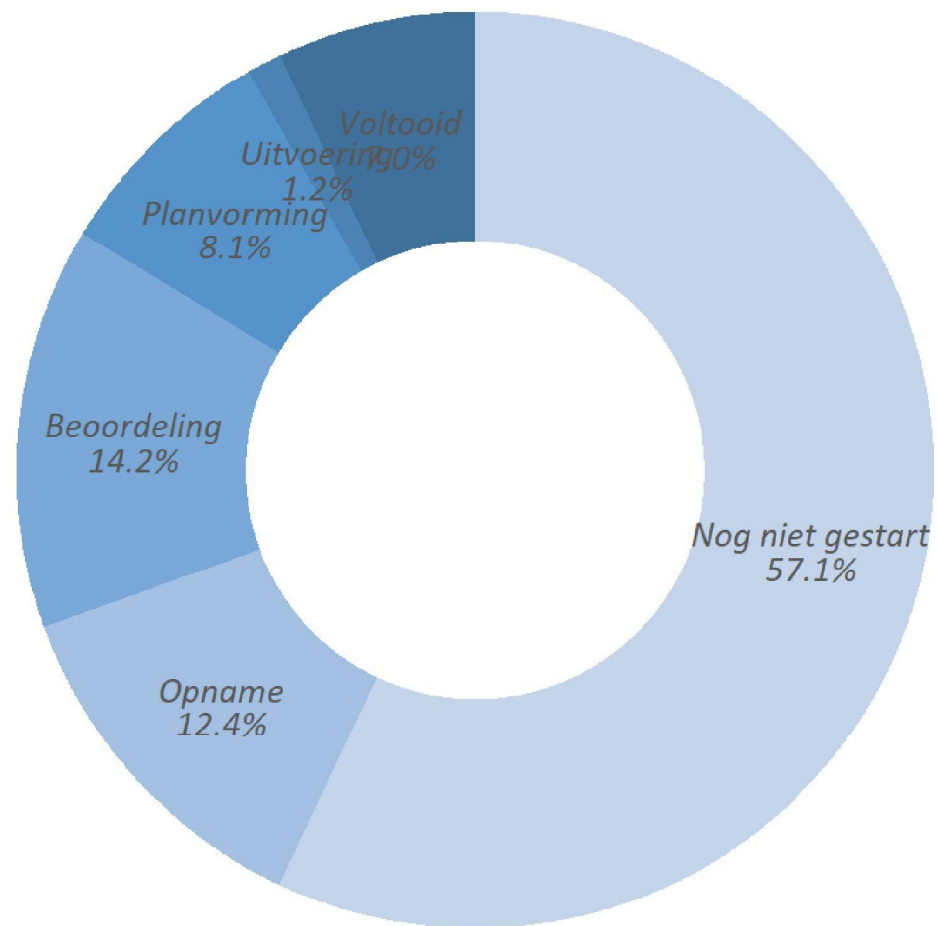

Vervolg

- Instemmen programmamanagers met dit voorstel
- Praktijkexercitie: alleen voor gem. Groningen samen met NCG
- Vergt dit nog formele besluitvorming bij:
 - NCG?
 - Gemeenten?
 - Nog anderen? (Rijk. prov?)
- Zo ja
- Formele besluitvorming organiseren
